



1 Stück



B500A				
Pos.	Anz.	ø	Länge	Bem.:
1	2	20	0.35	
2	6	14	3.87	
3	2	12	7.16	
4	8	12	4.78	
5	6	14	2.10	
6	4	10	0.60	
7	2	12	4.08	
8	15	20	0.50	
Gesamtgewicht 118.996 kg				

TAB 1. Mindestwerte der Biegerollendurchmesser bei einmaligem Biegen (DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle NA.8.1a)

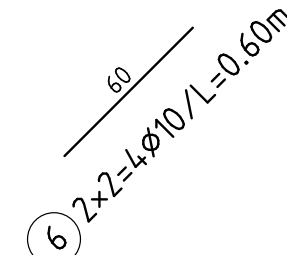

TAB 2. Mindestwerte der Biegerollendurchmesser  $d_{br}$  für nach dem Schweißen gebogene Bewehrung bei einmaligen Biegen (DIN EN 1992-1-1/NA, Tabelle NA.8.1b)

**BETONDECKUNG**

Verbleibende  $c_{dr}$

$c_{di}$  (Längsstab)

$c_{di}$  (Bügel)

Abstandhalter






Verbleibende  $c_{di}$

G-Stäbe  
- bei Baulast/Gewebe

- bei Rundstahl (senkrechte Stäbe außen)

- bei Rundstahl (senkrechte Stäbe innen)

[illegible]

OBERFLÄCHEN						
Sichtbeton glatt 	Einfüllsele 	Feingeglättet 	Sonderstruktur 	Alle Kanten fassen 		
Fertigf. - Position	Stück	Länge	Breite	Höhe	Volumen (m³)	Gewicht (kg)
09-241	1	7.22	4.34	0.20	5.64	14.10

 <b>KLEBL</b>		<b>KLEBL GmbH</b> 92319 Neumarkt i. d. OPf. Gölwiesstraße 2 Tel. (0 91 81) 9 00-0	
		Martin Schütz GmbH Platzenstraße 45 91054 Erlangen Tel. 09131-977 22-0 <a href="http://www.platz-06.de">www.platz-06.de</a>	
<b>Datum</b>	10.12.2019	<b>Bauvorhaben/Bauteil</b>	<b>Auflr. Nr.</b>
<b>Ges.</b>	Höbner	Sand- und Stauffwerke Neumarkt GmbH & Co KG Neubau einer Ausstellungshalle, und Containerhalle mit Büro	<b>819-19</b>
<b>Stat. Pos.</b>	WV-04		
<b>Masstab</b>	1:25		
<b>Wandplatte Pos. 09-241</b>		<b>Plan: Nr. / Index / Status</b>	
<b>Planschüssel</b>	<b>FT_XX_09-241_c_F</b>		
